


ETUDE DU TRITIUM DANS LA LOIRE À SAUMUR




Réunion 3 du comité de suivi – 22/03/2021
Déroulement de la campagne

Déroulement de la campagne et interventions techniques

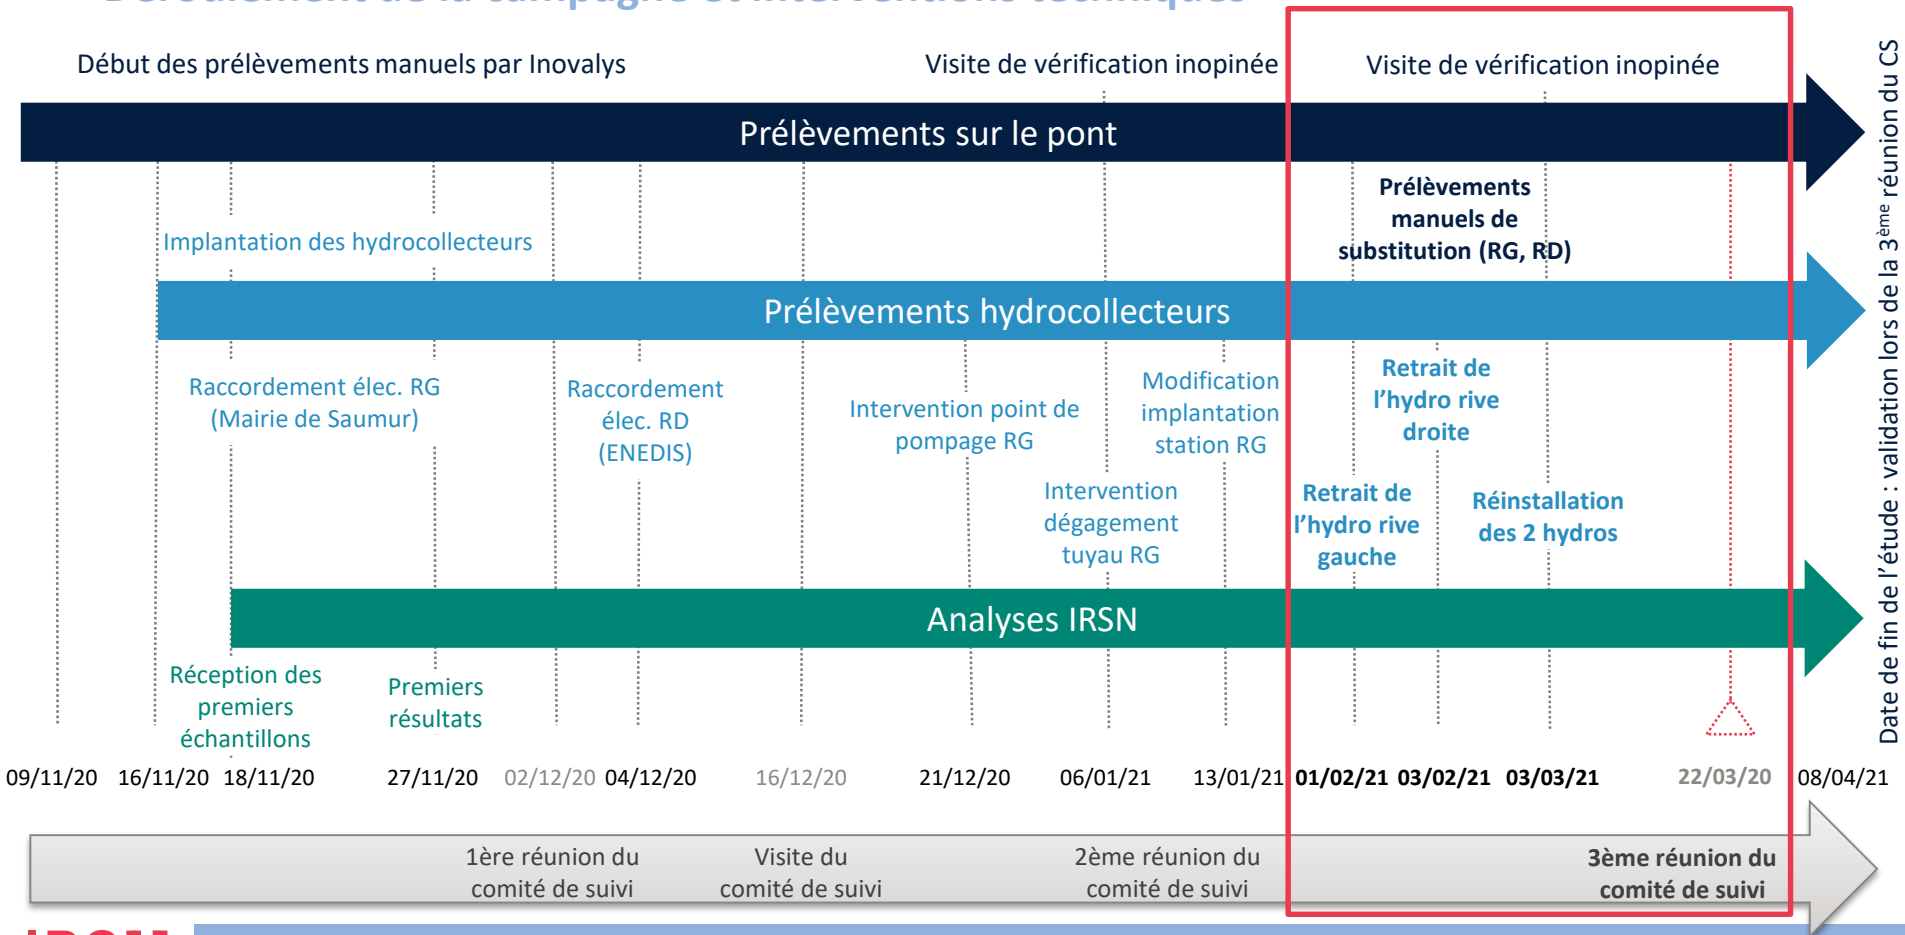


Crue de la Loire Janvier 2021

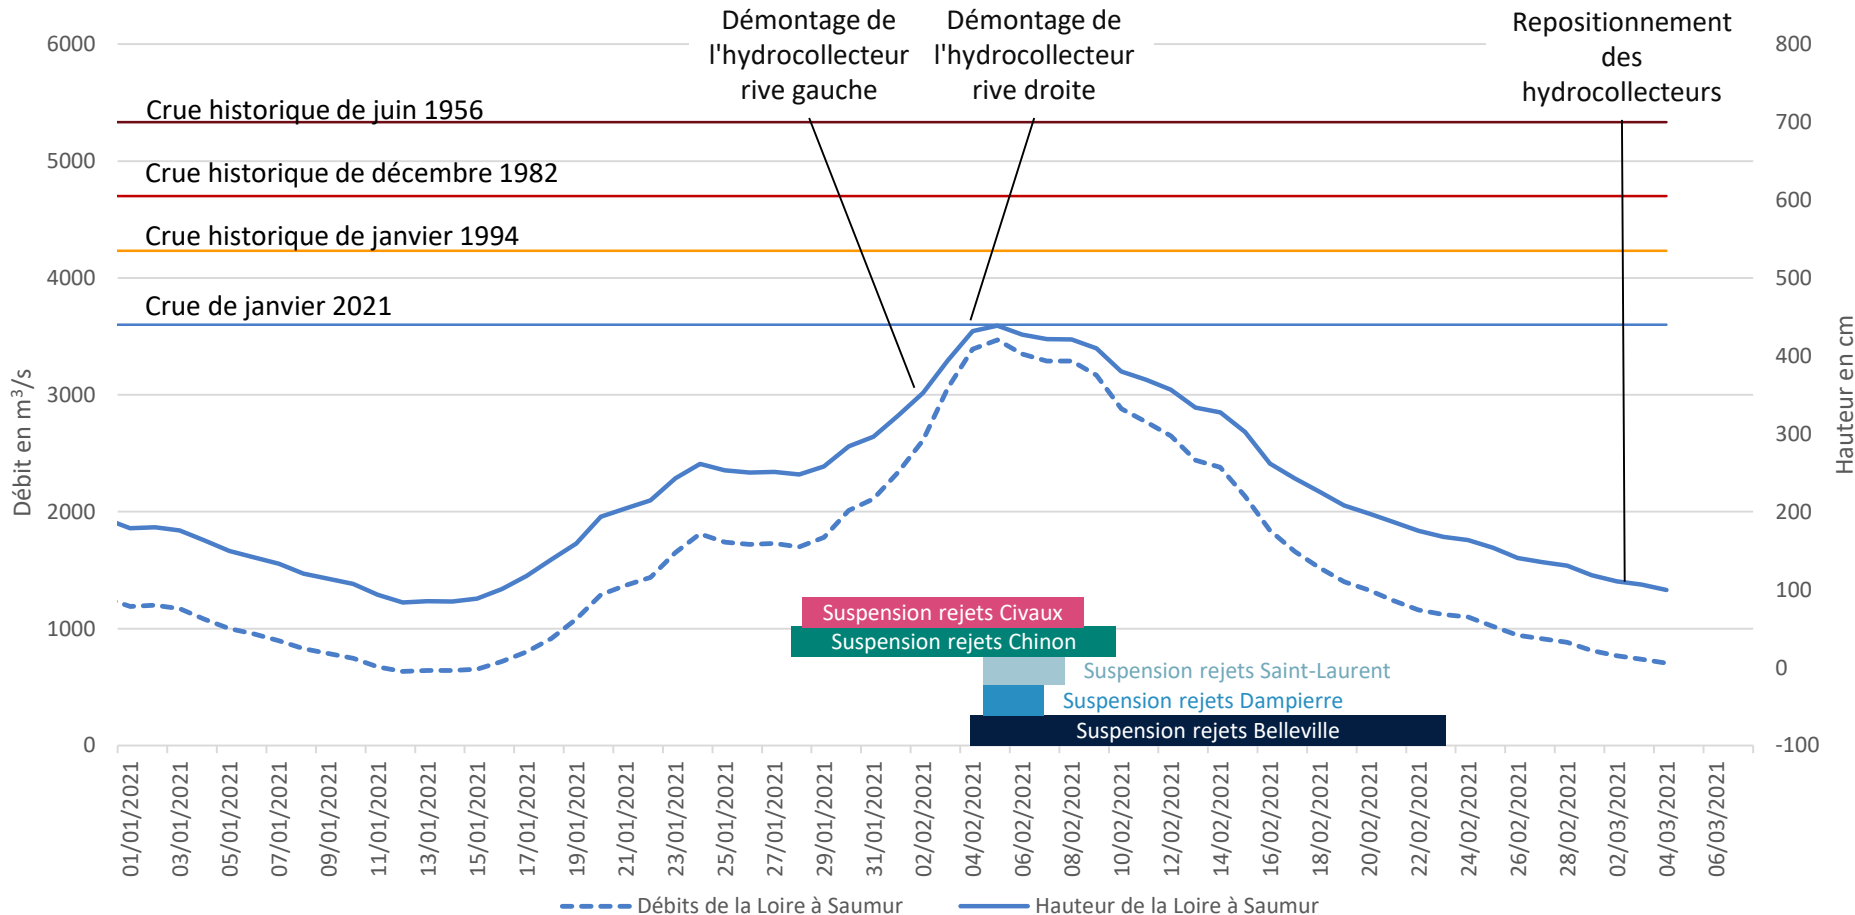

Retrait de l'hydrocollecteur rive gauche en urgence le 1^{er} février 2021

- Retrait de l'hydrocollecteur, du coffret, mise en sécurité des alimentations électriques,
- Stockage du coffret dans les locaux des services techniques Saumur
- Rapatriement de l'hydrocollecteur au Vésinet pour réparation
- Substitution des prélèvements de l'hydrocollecteur rive gauche par un prélèvement manuel sur le pont, tous les matins au point L

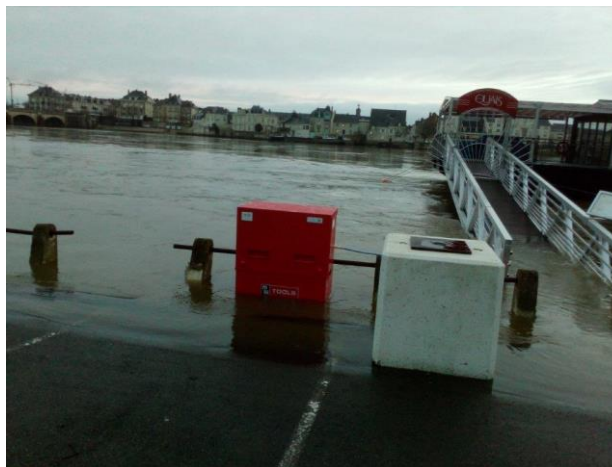


Retrait de l'hydrocollecteur rive droite le 3 février 2021


- Retrait de uniquement l'hydrocollecteur par Inovalys, stockage dans leurs locaux à Angers, coffret laissé en place
- Mise en sécurité des alimentations électriques
- Substitution des prélèvements de l'hydrocollecteur rive droite par un prélèvement manuel sur le pont tous les matins, au point A



Nouveaux flacons en verre brun
et plus résistants

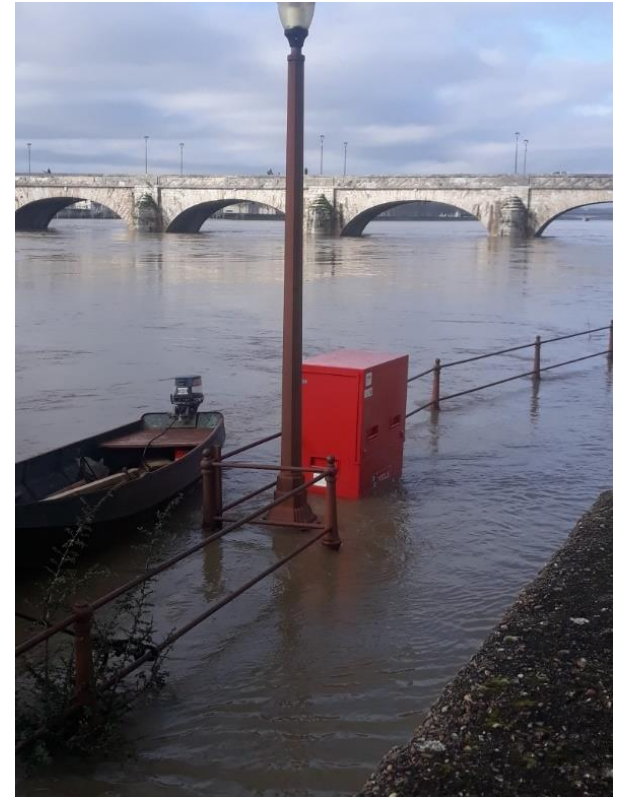

Récapitulatif des points réalisés sur le pont entre le 1^{er} février 2021 et le 3 mars 2021

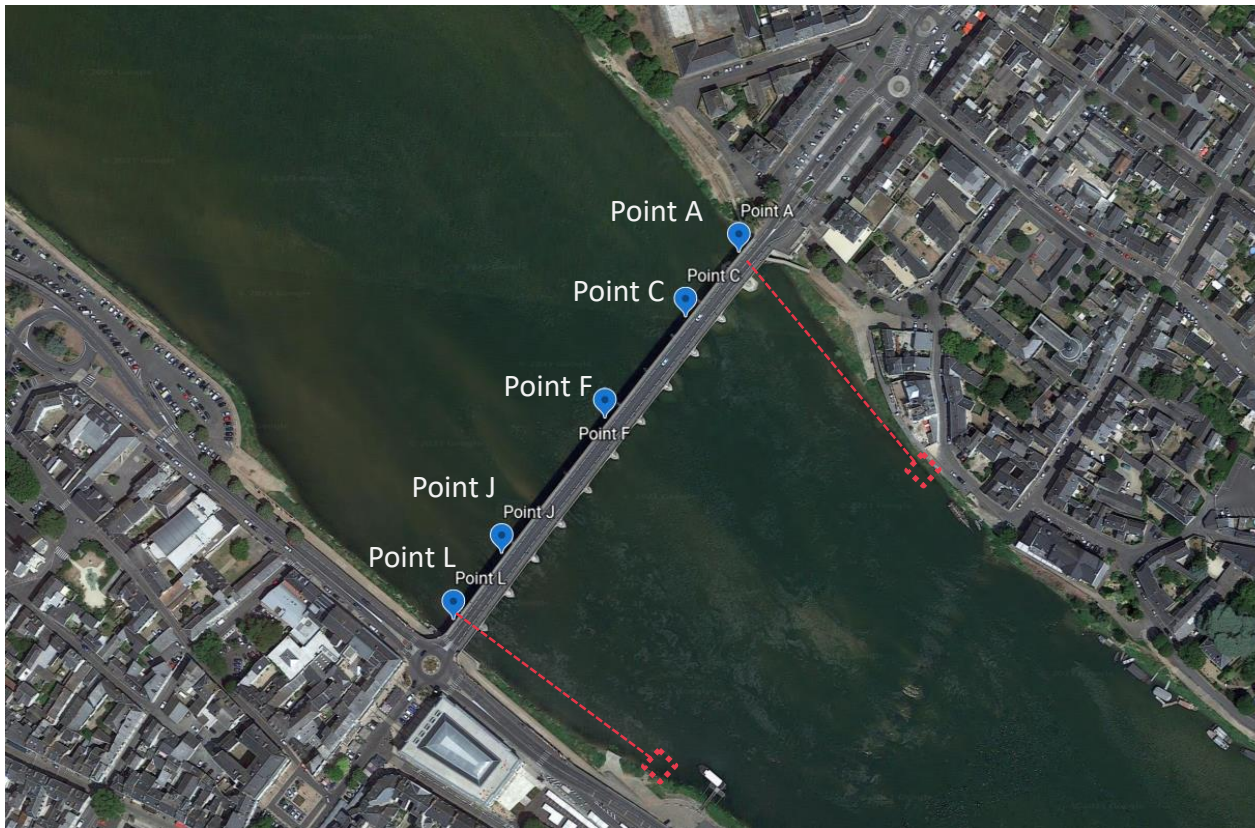

Réinstallation des deux hydrocollecteurs le mercredi 3 mars

Rive gauche



Rive droite



Visites de vérification inopinée d'Inovalys

[VÉRIFICATION DU 6 JANVIER 2021 :

Point de prélèvement	Préleveur	Date de prélèvement	Résultats	Seuil de décision
Point F	IRSN	06/01/2021 09:30	-	< 2,49 Bq/l
	Inovalys	06/01/2021 09:30	3,38 ±1,78 Bq/l	-
Point J	IRSN	06/01/2021 09:39	-	< 2,54 Bq/l
	Inovalys	06/01/2021 09:40	-	< 1,80 Bq/l

Résultats compatibles


Résultats compatibles

[VÉRIFICATION DU 3 MARS 2021 :

- Contrôle du respect des heures de prélèvement → OK
- Contrôle de l'application du protocole de prélèvement, d'identification, de transport et de conservation des échantillons → OK
- 4 Prélèvements en doublon réalisés par l'IRSN (résultats à venir)



Avancement de la campagne (au 09/03/2021)

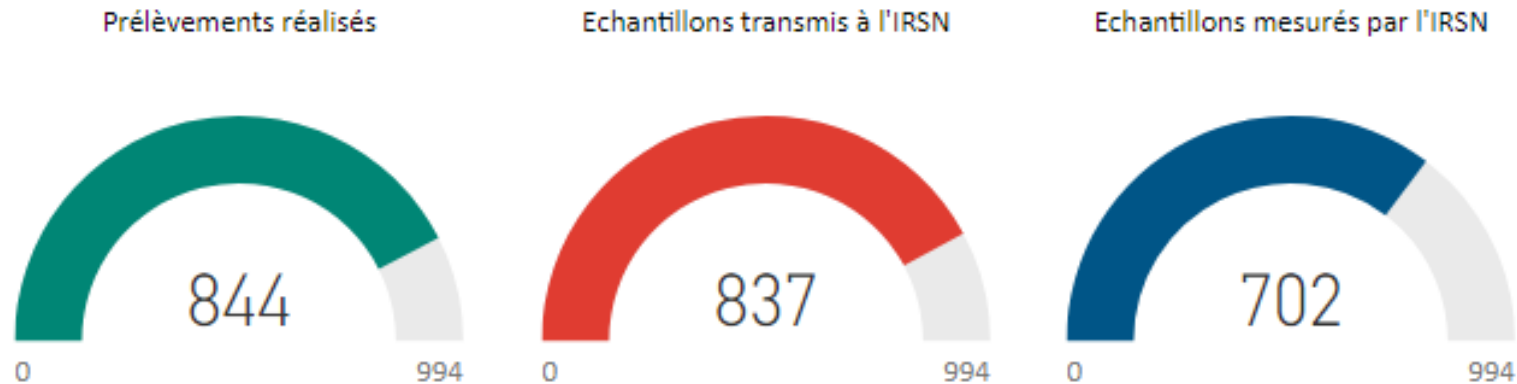

[RYTHME NOMINAL DE RÉCEPTION, PRÉPARATION ET MESURE DES ÉCHANTILLONS MAIS CHARGE DE TRAVAIL IRSN TRÈS IMPORTANTE

[MERCI]

[QUESTIONS ?]

→ RESULTATS DES MESURES DISPONIBLES
